



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	12/02/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Jubail Island Phase 2 Escrow	اسم المشروع
Project Number	2020/670930	رقم المشروع
Developer	Jubail Island investment Company LLC	المطور
Plot Number / Details	Plot 1A	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Jubail Island	المنطقة
Sector - Municipality	Jubail South	الحوض - البلدية
Consultant	Consulting Engineers (EHAF)	الاستشاري
Project Manager	LEAD Real Estate Developer LLC	مدير المشروع
Main Contractor	Arabian Construction Company – W L L	المقاول الرئيسي

Engineering Company الشركة الهندسية	Site visit Date تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties	26/01/2026

Actual Progress Percentage نسبة الإنجاز الفعلي	96.50 %
Progress Percentage from the Last Progress Report نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	0.6 %

Notes ملاحظات
The project is delayed by -3.50%

Engineering Company Signature توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy رئيس قسم إدارة المشاريع



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images

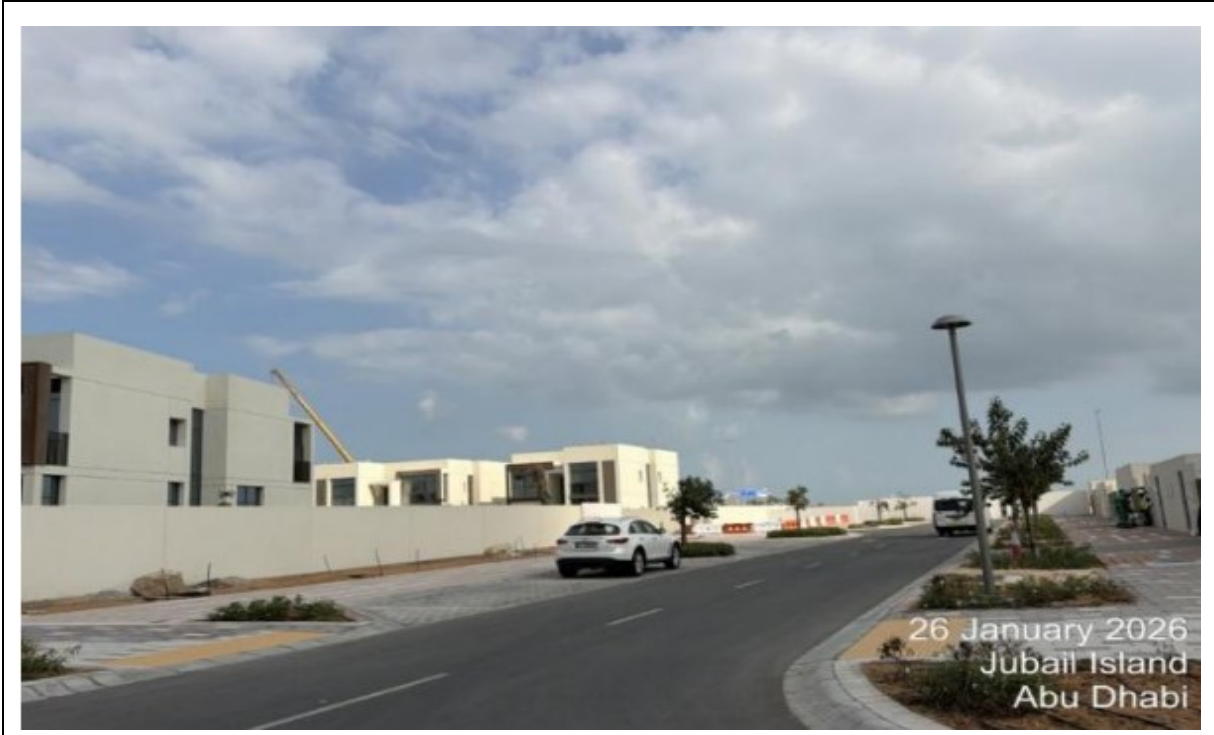

support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة



P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates




support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة



P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

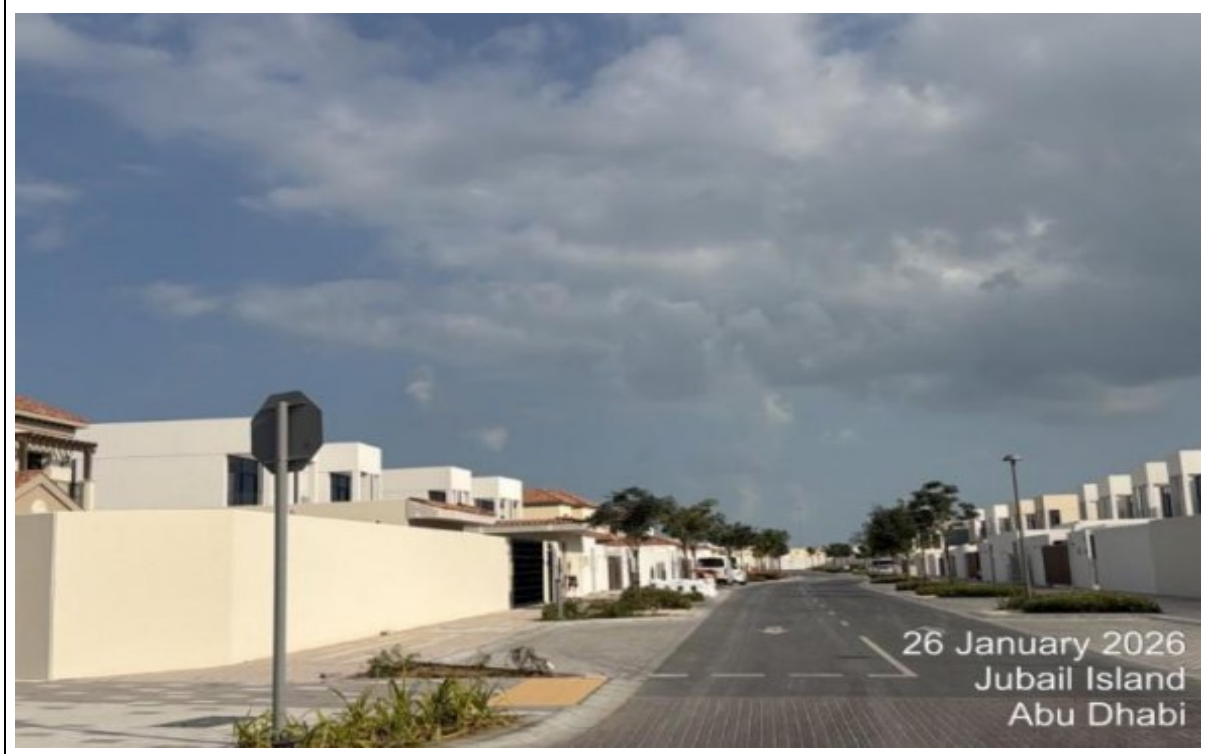

Handwritten signature in blue ink.

support@dari.ae 

الإمارات العربية المتحدة 

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates
