



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	13/05/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Bada Al Jubail 1	اسم المشروع
Project Number	20230000154450	رقم المشروع
Developer	JUBAIL ISLAND INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.	المطور
Plot Number / Details	Jubail South JS	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Jubail Island	المنطقة
Sector - Municipality	Jubail South	الحوض - البلدية
Consultant	Parson International Limited	الاستشاري
Project Manager	LEAD Real Estate Developer LLC	مدير المشروع
Main Contractor	Gulf Contractors	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		06/05/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	57.23 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	8.9 %

Notes	ملاحظات
Ahead by +6.73%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع


support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images

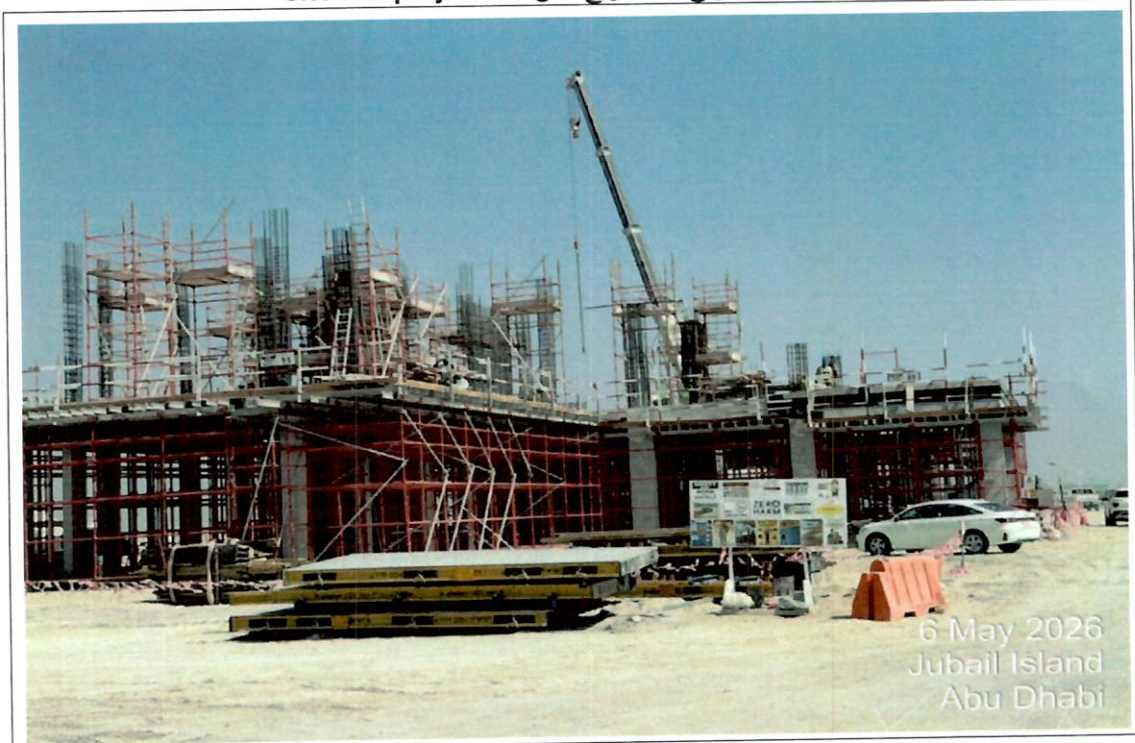

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential



Handwritten signature

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates
