



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	17/08/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Vista Del Mar	اسم المشروع
Project Number	20240000210180	رقم المشروع
Developer	ABDULWAHID FAQEEH INVESTMENT COMPANY	المطور
Plot Number / Details	Plot: C16	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Yas Island	المنطقة
Sector - Municipality	YS2	الحوض - البلدية
Consultant	NEB ENGINEERING CONSULTANCY OFFICE	الاستشاري
Project Manager	ESNAD Management	مدير المشروع
Main Contractor	ALBA-TEC CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Date Site visit تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties LLC		11/08/2026

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	82.00 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	1.54%

Notes	ملاحظات
The project is delayed -18.00%	


Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Mohammed Al Araj	ممثل الشركة: محمد الأعرج
Projects Manager - Projects Management Consultancy	مدير مشاريع - قسم إدارة المشاريع



دائرة البلديات والنقل
DEPARTMENT OF MUNICIPALITIES
AND TRANSPORT



Site and project Images صور الموقع والمشروع

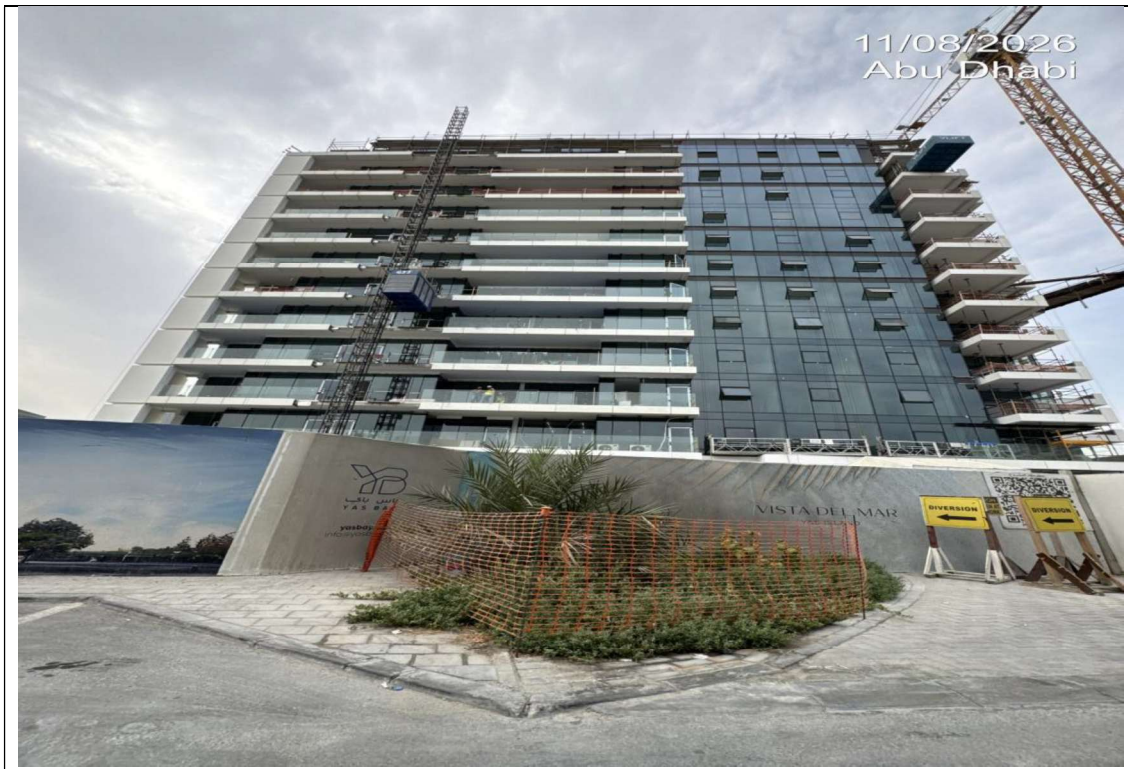

Handwritten signature and initials.



www.dari.ae

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Confidential



صور الموقع والمشروع Site and project Images



11 August 2026 at 3:54 PM
Yas Island
Abu Dhabi



11 August 2026 at 3:53 PM
Yas Island
Abu Dhabi





صور الموقع والمشروع Site and project Images

