



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Report Date | 19/05/2026 | تاريخ التقرير |
| Project Name | Vista Del Mar | اسم المشروع |
| Project Number | 20240000210180 | رقم المشروع |
| Developer | ABDULWAHID FAQEEH INVESTMENT COMPANY | المطور |
| Plot Number / Details | Plot: C16 | رقم الأرض / معرف العقار |
| Zone | Yas Island | المنطقة |
| Sector - Municipality | YS2 | الحوض - البلدية |
| Consultant | NEB ENGINEERING CONSULTANCY OFFICE | الاستشاري |
| Project Manager | ESNAD Management | مدير المشروع |
| Main Contractor | ALBA-TEC CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - LLC | المقاول الرئيسي |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Engineering Company | الشركة الهندسية | Date Site visit تاريخ زيارة الموقع |
| MPM Properties LLC | | 29/04/2026 |

| | | |
|---|--|---------|
| Actual Progress Percentage | نسبة الإنجاز الفعلي | 71.66 % |
| Progress Percentage from the Last Progress Report | نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي | 4.99 % |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Notes | ملاحظات |
| The project is delayed -28.34% | |

| | |
|---|-------------------------|
| Engineering Company Signature | توقيع الشركة الهندسية |
| Company representative: Arram Zuhud | ممثل الشركة: عرام زهد |
| Head of Projects Management Consultancy | رئيس قسم إدارة المشاريع |



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates




صور الموقع والمشروع Site and project Images





صور الموقع والمشروع Site and project Images

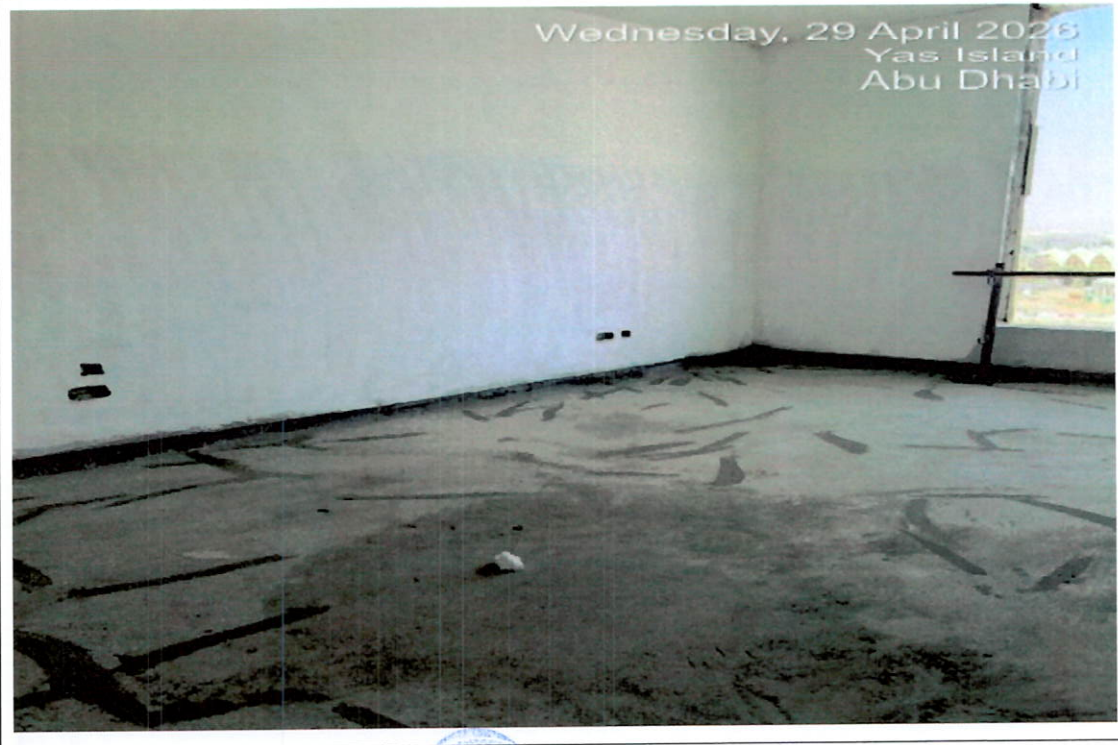

MPM
Properties
المقاربية
Projects
المشاريع

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential



صور الموقع والمشروع Site and project Images

