



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Report Date | 17/02/2026 | تاريخ التقرير |
| Project Name | Bab Al Qasr residence 25 | اسم المشروع |
| Project Number | 20240000314656 | رقم المشروع |
| Developer | Ajyal Burtville Real Estate Development | المطور |
| Plot Number / Details | Plot: 11 | رقم الأرض / معرف العقار |
| Zone | Yas Island | المنطقة |
| Sector - Municipality | YS2, Yas Island | الحوض - البلدية |
| Consultant | Al Shamikha Engineering Consultancy | الاستشاري |
| Project Manager | ----- | مدير المشروع |
| Main Contractor | Burtplace General Contracting LLC | المقاول الرئيسي |

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Engineering Company | الشركة الهندسية | Site visit Date | تاريخ زيارة الموقع |
| MPM Properties | | 09/02/2026 | |

| | | |
|---|--|---------|
| Actual Progress Percentage | نسبة الإنجاز الفعلي | 26.12 % |
| Progress Percentage from the Last Progress Report | نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي | 1.17 % |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Notes | ملاحظات |
| The project is ahead by + 0.31% | |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Engineering Company Signature | | توقيع الشركة الهندسية |
| Company representative: Arram Zuhud |  | ممثل الشركة: عرام زهد |
| Head of Projects Management Consultancy | | رئيس قسم إدارة المشاريع |


support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O. Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images

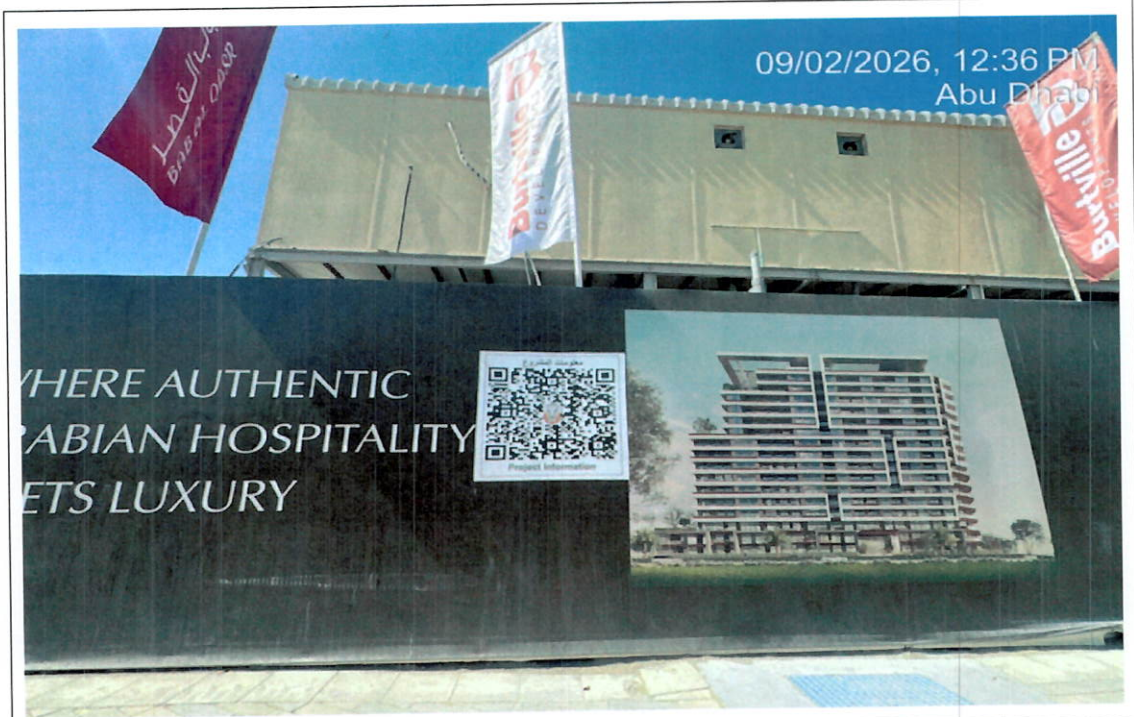



صور الموقع والمشروع Site and project Images



MPM
المقاربية
Properties
Projects
المشاريع



صور الموقع والمشروع Site and project Images



Handwritten signature in blue ink.

support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة



P.O. Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential

