



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	15/09/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Bab Al Qasr Resort Residence 18	اسم المشروع
Project Number	20250000430524	رقم المشروع
Developer	BURTVILLE PRSW REAL ESTATE DEVELOPMENT	المطور
Plot Number / Details	Plot: 19	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Khalifa City	المنطقة
Sector - Municipality	SE45-05	الحوض - البلدية
Consultant	Al Shamikha Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager	_____	مدير المشروع
Main Contractor	Burtplace General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		08/09/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	43.47 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	5.93 %

Notes	ملاحظات
The project is ahead by + 6.04 %	

Engineering Company Signature توقيع الشركة الهندسية	
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع

MPM
Properties
المقاربية
Projects
المشاريع

support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



Site and project Images صور الموقع والمشروع



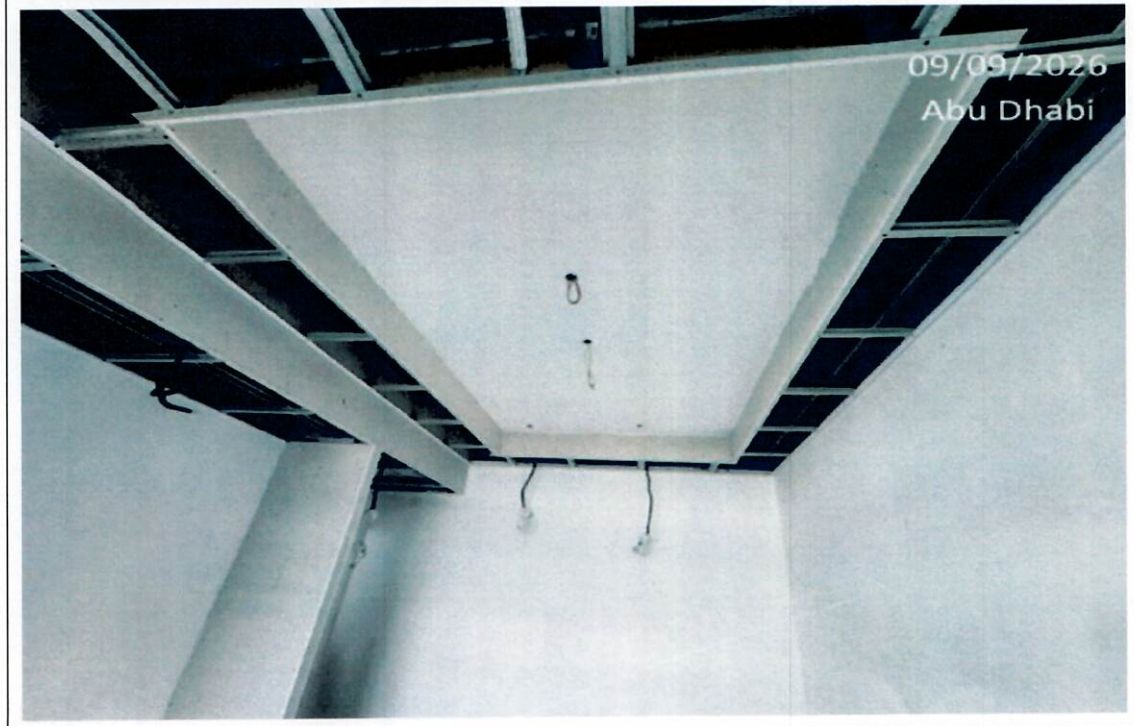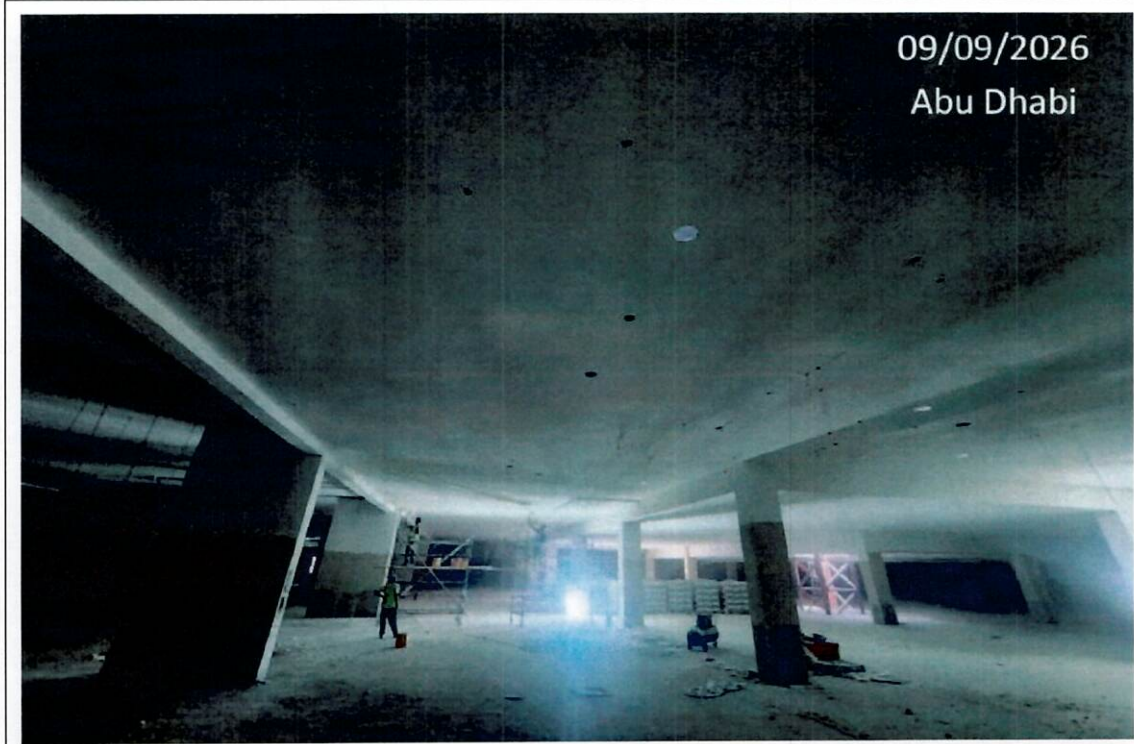

صور الموقع والمشروع Site and project Images

MPM
Properties
المشاريع
Projects

www.dari.ae

Confidential

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



09/09/2026
Abu Dhabi



09/09/2026
Abu Dhabi

Handwritten signature in blue ink.
