



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	14/08/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Bab Al Qasr residence 31	اسم المشروع
Project Number	B1N-2024-013684	رقم المشروع
Developer	Ajyal Burtville Real Estate Development	المطور
Plot Number / Details	Plot: 17	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Yas Island	المنطقة
Sector - Municipality	YS2, Yas Island	الحوض - البلدية
Consultant	Al Shamikha Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager		مدير المشروع
Main Contractor	Burtplace General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		11/08/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	44.30 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	4.80 %

Notes	ملاحظات
The project is ahead by + 10.89 %	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Mohamed Jamal Al Araji	ممثل الشركة: محمد جمال الأعرج
Projects Manager – Project Management Consultancy	مدير مشاريع – قسم إدارة المشاريع



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة


P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential



صور الموقع والمشروع Site and project Images

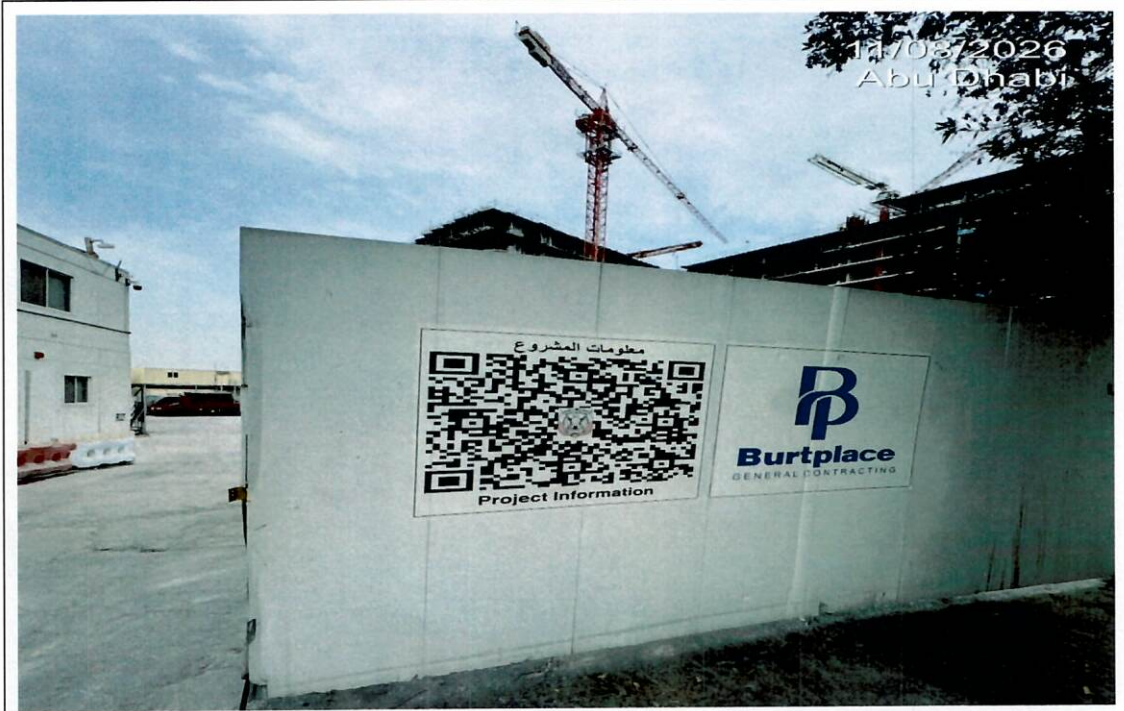



Site and project Images صور الموقع والمشروع



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates


www.dari.ae

Confidential

MPDM
المقارنية
Projects
المشاريع



صور الموقع والمشروع Site and project Images

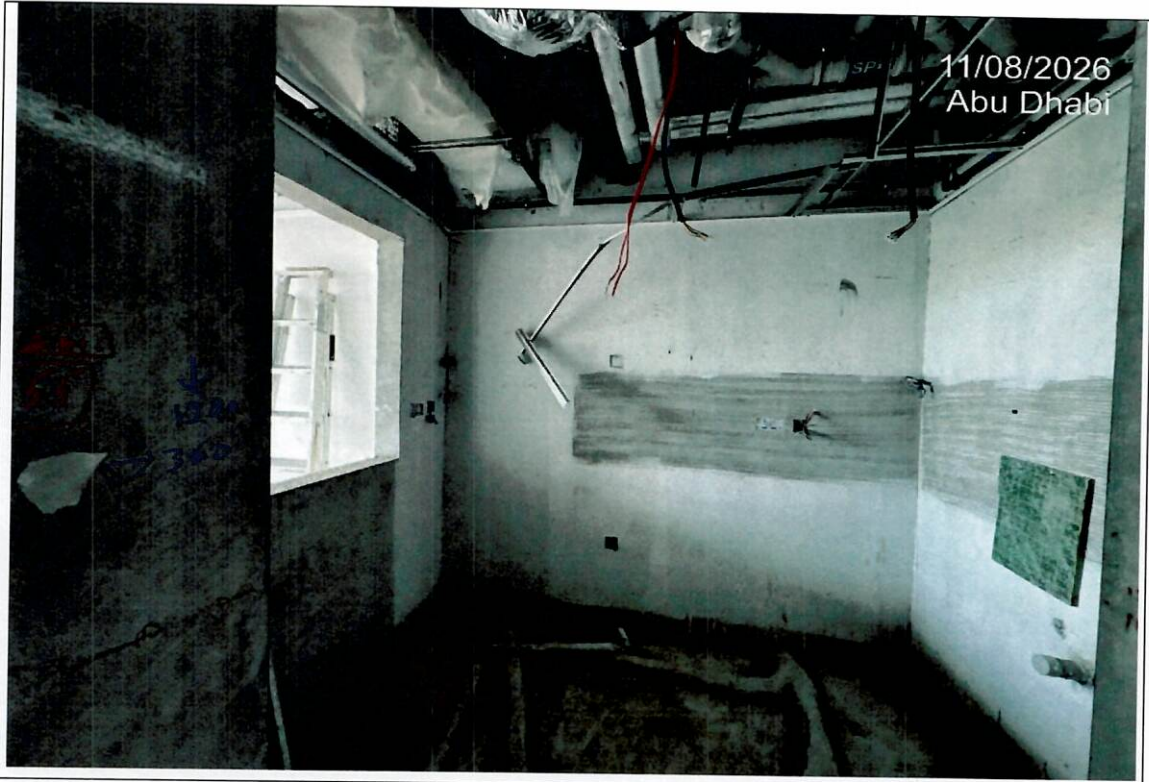

Handwritten signature in blue ink.



MPM
المقاربية
Projects
المشاريع

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential
