



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري  
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	13/04/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Bab Al Qasr residence 31	اسم المشروع
Project Number	B1N-2024-013684	رقم المشروع
Developer	Ajyal Burtville Real Estate Development	المطور
Plot Number / Details	Plot: 17	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Yas Island	المنطقة
Sector - Municipality	YS2, Yas Island	الحوض - البلدية
Consultant	Al Shamikha Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager	_____	مدير المشروع
Main Contractor	Burtplace General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		07/04/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	36.39 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	3.09 %


Notes	ملاحظات
The project is ahead by + 4.32%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع
	 Arram Zuhud Head of Project Management Consultancy MPM PROPERTIES 802300





صور الموقع والمشروع

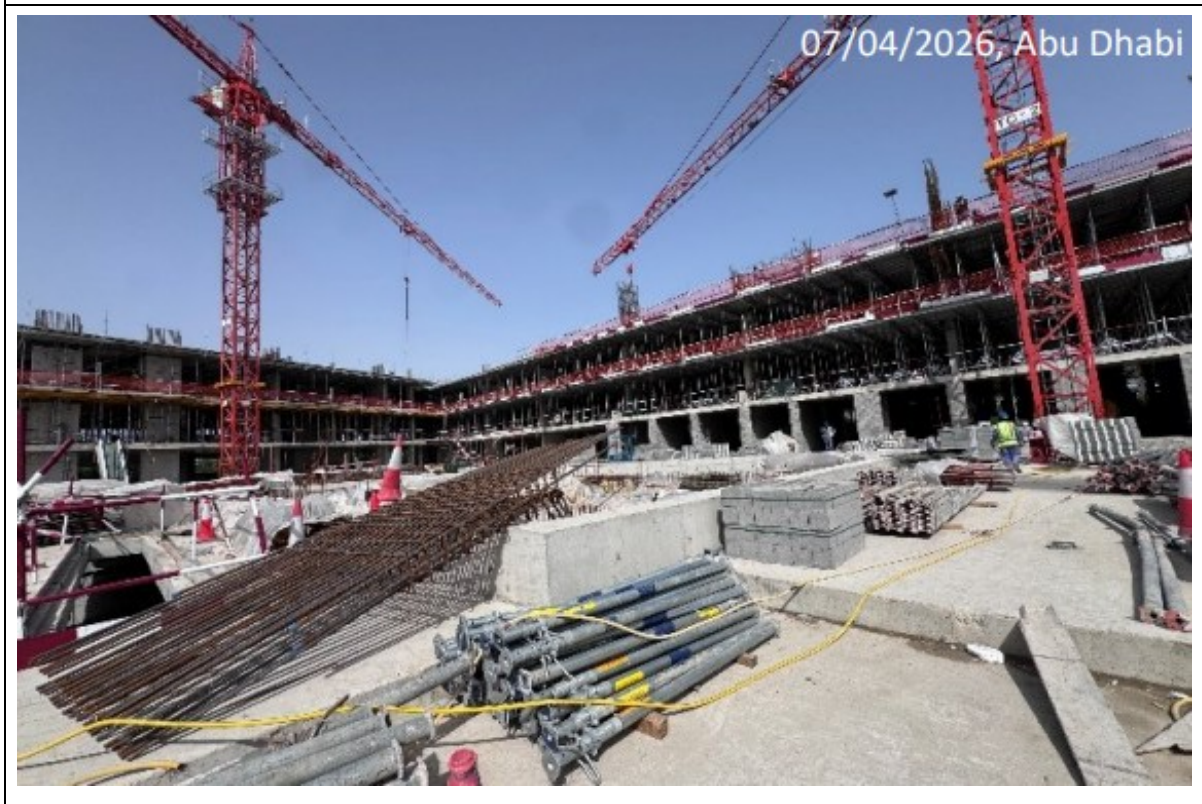

support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة



P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images



support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة



P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

