



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	28/09/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Ville 12	اسم المشروع
Project Number	20250000426322	رقم المشروع
Developer	Ajyal Burtville Real Estate Development	المطور
Plot Number / Details	Plot: 34	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	MASDAR CITY	المنطقة
Sector - Municipality	SE45-01, MASDAR	الحوض - البلدية
Consultant	Al Shamikha Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager		مدير المشروع
Main Contractor	Burtplace General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		23/09/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	47.71 %
نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	Progress Percentage from the Last Progress Report	3.48 %

Notes	ملاحظات
The project is ahead by + 3.64 %	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع





صور الموقع والمشروع Site and project Images






صور الموقع والمشروع Site and project Images





صور الموقع والمشروع Site and project Images

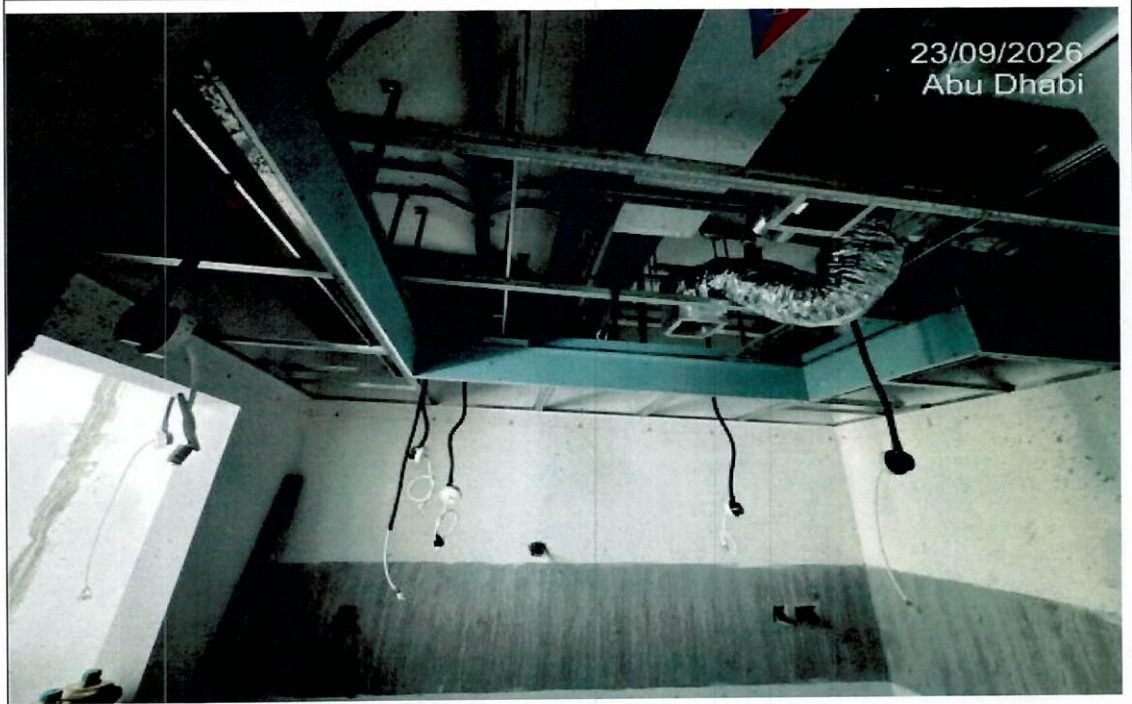

Signature
