



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	16/07/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Ville 12	اسم المشروع
Project Number	20250000426322	رقم المشروع
Developer	Ajyal Burtville Real Estate Development	المطور
Plot Number / Details	Plot: 34	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	MASDAR CITY	المنطقة
Sector - Municipality	SE45-01, MASDAR	الحوض - البلدية
Consultant	Al Shamikha Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager	_____	مدير المشروع
Main Contractor	Burtplace General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		15/07/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	44.23 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	7.72 %

Notes	ملاحظات
The project is ahead by + 4.14 %	

Engineering Company Signature توقيع الشركة الهندسية	
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images






صور الموقع والمشروع Site and project Images





صور الموقع والمشروع Site and project Images

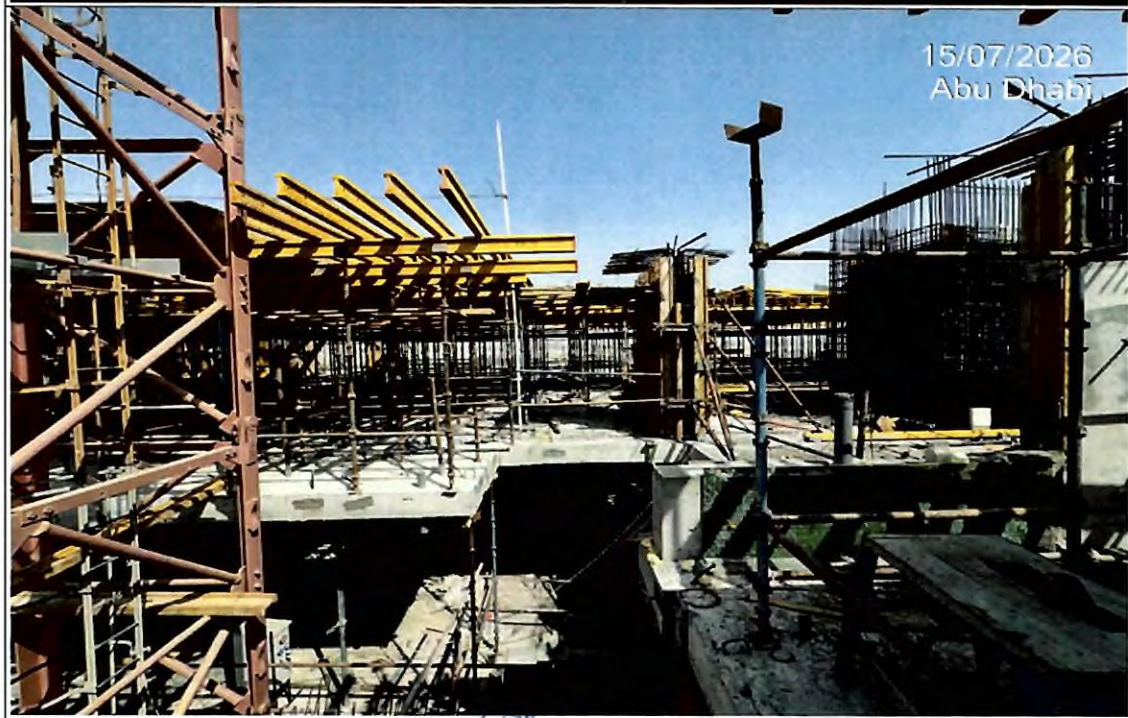

Handwritten signature in blue ink.



MPM
المقاربية
Properties
Projects
المشاريع

support@dari.ae



الإمارات العربية المتحدة



P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential
