



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	23/04/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Bab Al Qasr Canal View Residence 22	اسم المشروع
Project Number	20250000529701	رقم المشروع
Developer	BURTVILLE P R S W REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC	المطور
Plot Number / Details	Plot C02	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Raha Beach	المنطقة
Sector - Municipality	RBW3	الحوض - البلدية
Consultant	Al Shamikha Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager	_____	مدير المشروع
Main Contractor	Burtplace General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		16/04/2026	


Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	14.63 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	3.63 %

Notes	ملاحظات
The project is ahead by + 10.78%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع
	 Arram Zuhud Head of Project Management Consultancy MPM PROPERTIES 502300




صور الموقع والمشروع صور الموقع والمشروع

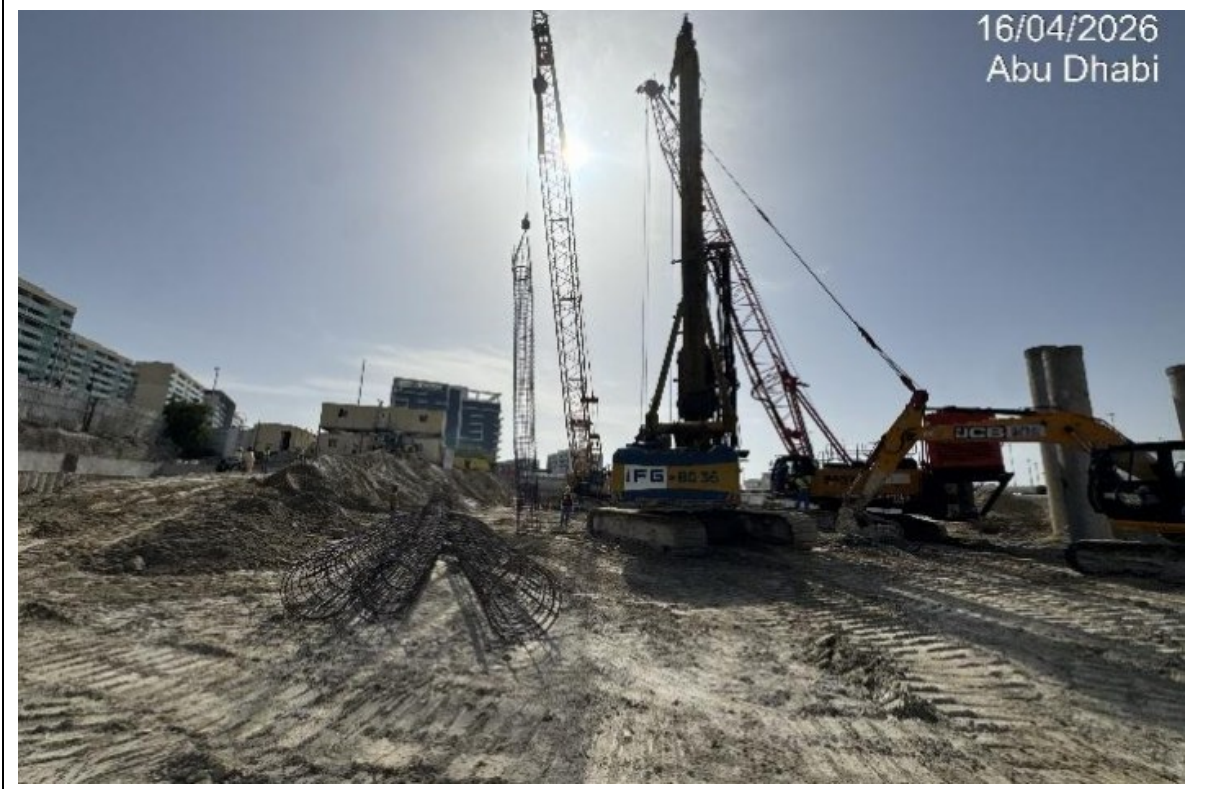



صور الموقع والمشروع Site and project Images

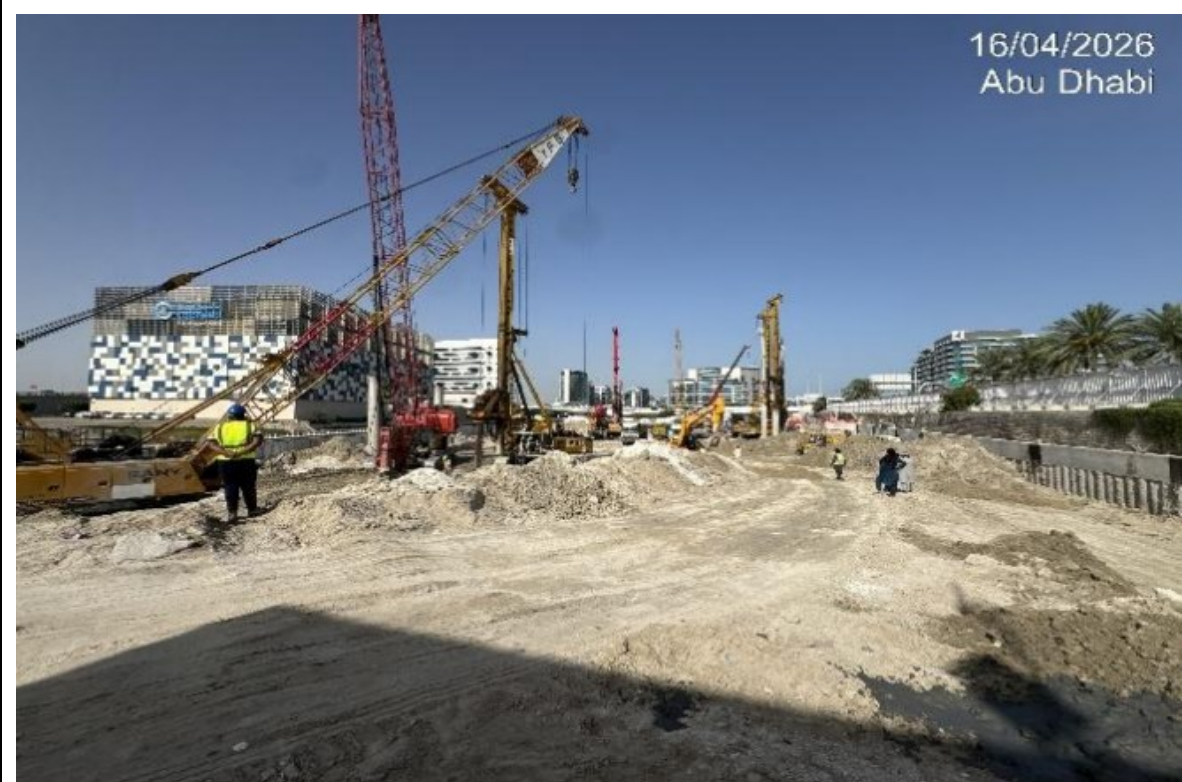



صور الموقع والمشروع Site and project Images



Handwritten signature in blue ink.
