



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	10/08/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Nour Building	اسم المشروع
Project Number	20250000513230	رقم المشروع
Developer	Maskan MS Contracting and Real Estate Development – L.L.C – S.P.C	المطور
Plot Number / Details	Plot 866	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Shamkhah	المنطقة
Sector - Municipality	SH36	الحوض - البلدية
Consultant	My Dream Engineering Consultancy LLC	الاستشاري
Project Manager		مدير المشروع
Main Contractor	Wesam Al Oudi General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	تاريخ زيارة الموقع Site visit Date
MPM Properties		05/08/2026

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	76.44 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	6.72 %

Notes	ملاحظات
The project is ahead by +5.45%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Mohammed Al Araj	ممثل الشركة: محمد الأعرج
Projects Manager - Projects Management Consultancy	مدير مشاريع - قسم إدارة المشاريع
Mohammed Jamal Alara	
Projects Manager	
MPM Properties	
007844	



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



Site and project Images صور الموقع والمشروع



MPM
Properties المقامات
Projects المشاريع

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة


P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential



صور الموقع والمشروع Site and project Images

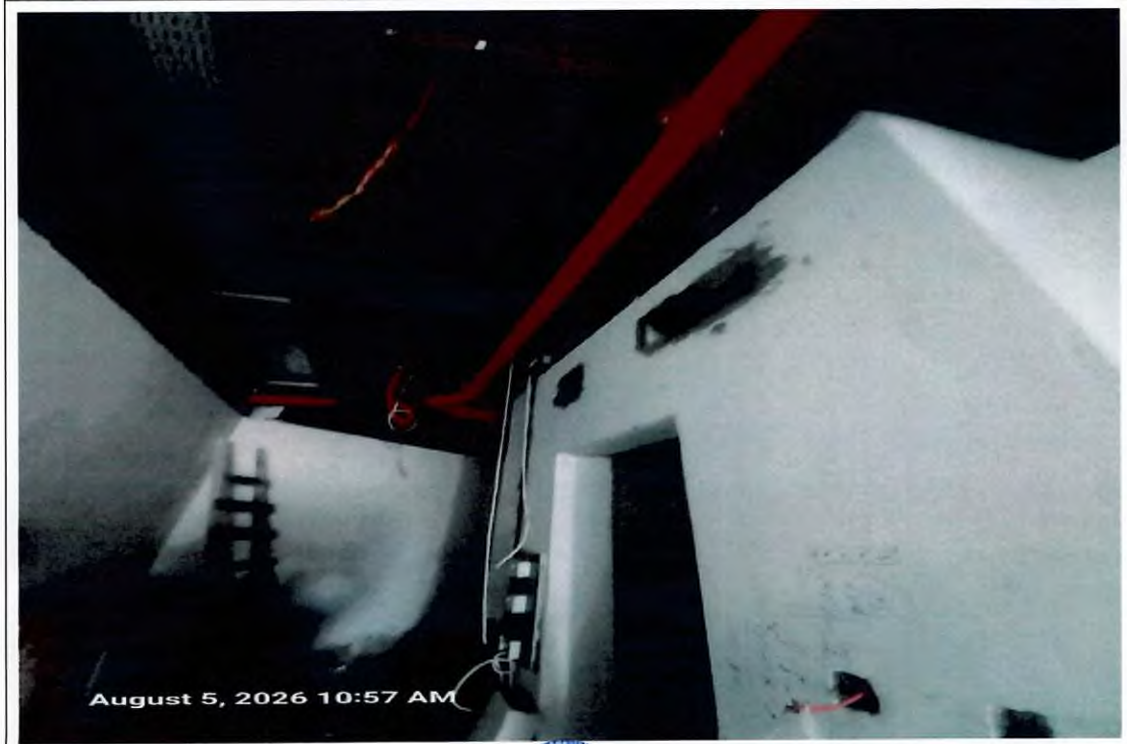

MPM
المقاربية
Projects
المشاريع

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential



Site and project Images صور الموقع والمشروع



MPM
المقاربية
Projects
المشاريع
