



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري  
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	05/05/2026	تاريخ التقرير
Project Name	YAS BEACH RESIDENCE	اسم المشروع
Project Number	2020/410062	رقم المشروع
Developer	YAS BEACH RESIDENCE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C.	المطور
Plot Number / Details	C2_C3	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Yas Island	المنطقة
Sector - Municipality	YS2-Yas Bay	الحوض - البلدية
Consultant	SOCIETY TECHNOLOGY HOUSE L.L.C	الاستشاري
Project Manager	—	مدير المشروع
Main Contractor	Alsafkha Algadidah Corporation For Investment Real Estate Development	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		17/04/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	41.93 %
Progress Percentage since the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندي	1.57 %

Notes	ملاحظات
The project is delayed by -42.94%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع






Site and project Images

صور الموقع والمشروع





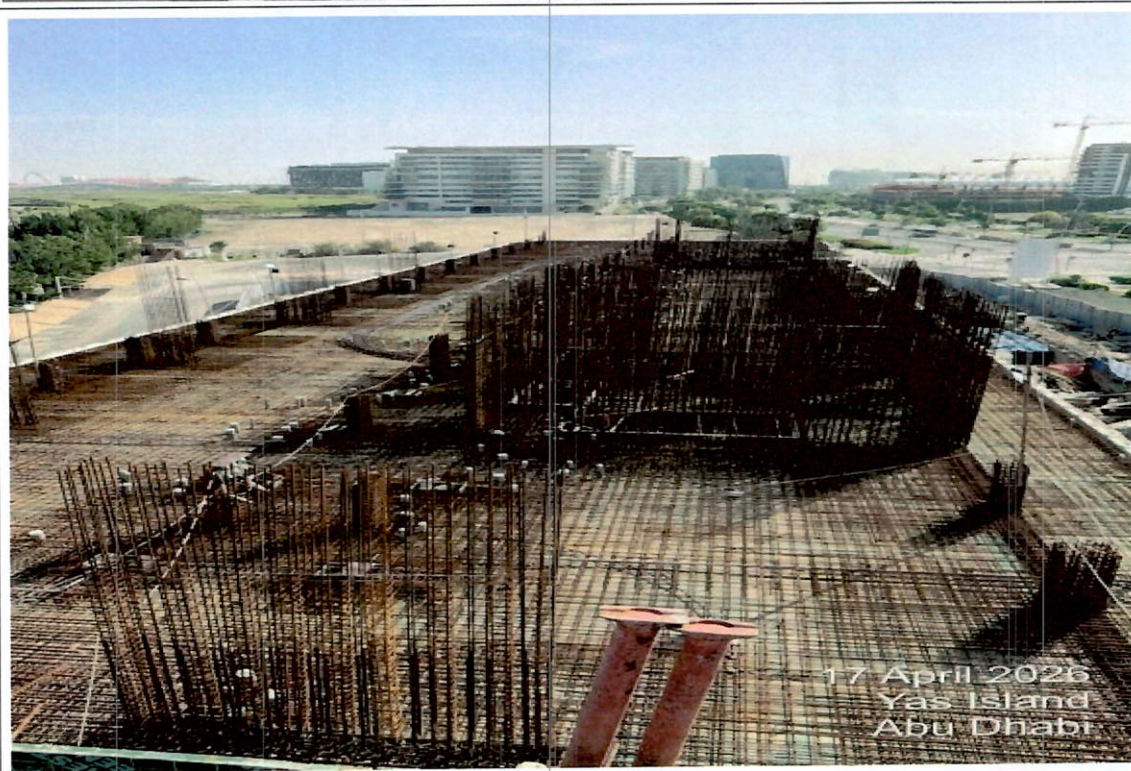

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

