



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري  
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	23/04/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Al Mahra Residence – Masdar City	اسم المشروع
Project Number	2019/344662	رقم المشروع
Developer	SIADAH International Developments L.L.C.	المطور
Plot Number / Details	18	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Masdar City	المنطقة
Sector - Municipality	SE 45-05	الحوض - البلدية
Consultant	IBRIDGE ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C. / Society Technology House Consultancy LLC	الاستشاري
Project Manager	—	مدير المشروع
Main Contractor	Nantong Gulf Construction Engineering CO LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	تاريخ زيارة الموقع Site visit Date
MPM Properties		22/04/2026

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	90.51 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	2.73 %

Notes	ملاحظات
The project is delayed by -7.77%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates




صور الموقع والمشروع Site and project Images





صور الموقع والمشروع Site and project Images

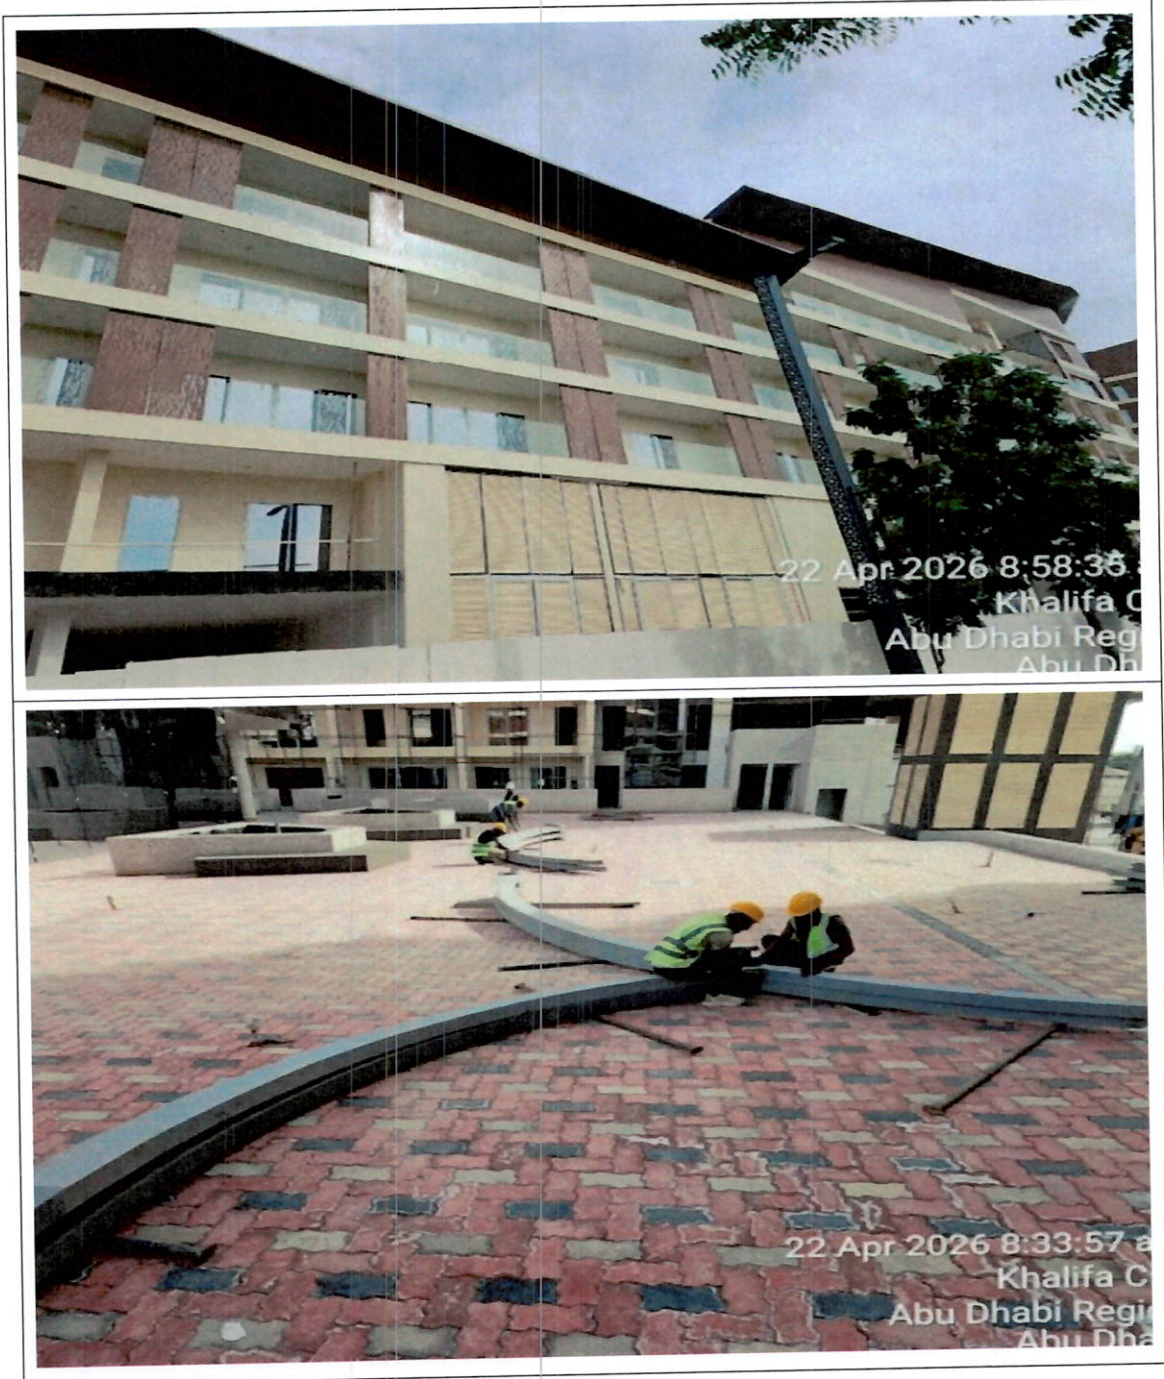

*Handwritten signature*



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates
