



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	11/09/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Reeman Garden 1	اسم المشروع
Project Number	20240000385092	رقم المشروع
Developer	United Avenue Real Estate Development LLC	المطور
Plot Number / Details	Plot C4	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Shamkhah	المنطقة
Sector - Municipality	SH36	الحوض - البلدية
Consultant	Lamaison Engineering Consultancy	الاستشاري
Project Manager		مدير المشروع
Main Contractor	Silver Falcon General Contracting LLC	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		07/09/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	92 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	21.38 %

Notes	ملاحظات
The project is ahead by 18.00%	

Engineering Company Signature		توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Arram Zuhud		ممثل الشركة: عرام زهد
Head of Projects Management Consultancy		رئيس قسم إدارة المشاريع



MPM
Properties
المقاربية
المشاريع

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

دائرة البلديات والنقل
DEPARTMENT OF MUNICIPALITIES
AND TRANSPORT



صور الموقع والمشروع Site and project Images



Handwritten signature in blue ink.



MPM
Properties
المفارية
Projects
المشاريع

www.dari.ae

Confidential

support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates




7 Sep 2026 at 9:15:57 AM
Ad Dar Street
Al Shamkhah City
Abu Dhabi
United Arab Emirates




7 Sep 2026 at 9:20:49 AM
Ad Dar Street
Al Shamkhah City
Abu Dhabi
United Arab Emirates

Handwritten signature in blue ink.

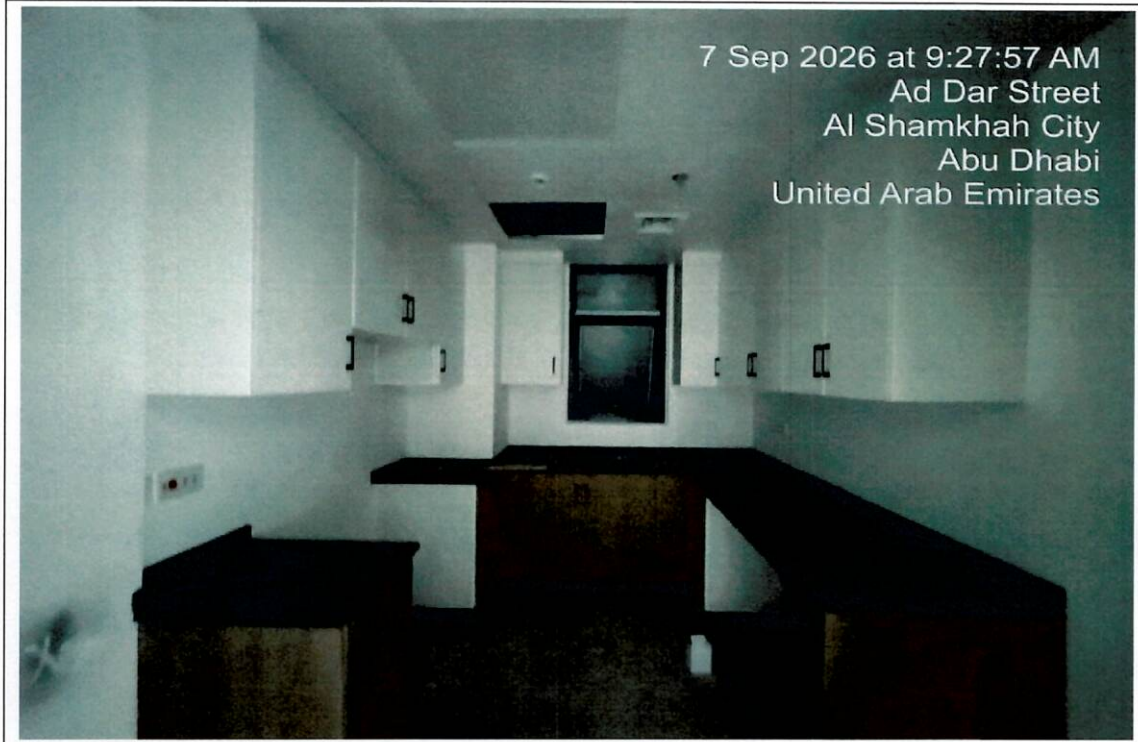

7 Sep 2026 at 9:27:57 AM
Ad Dar Street
Al Shamkhah City
Abu Dhabi
United Arab Emirates

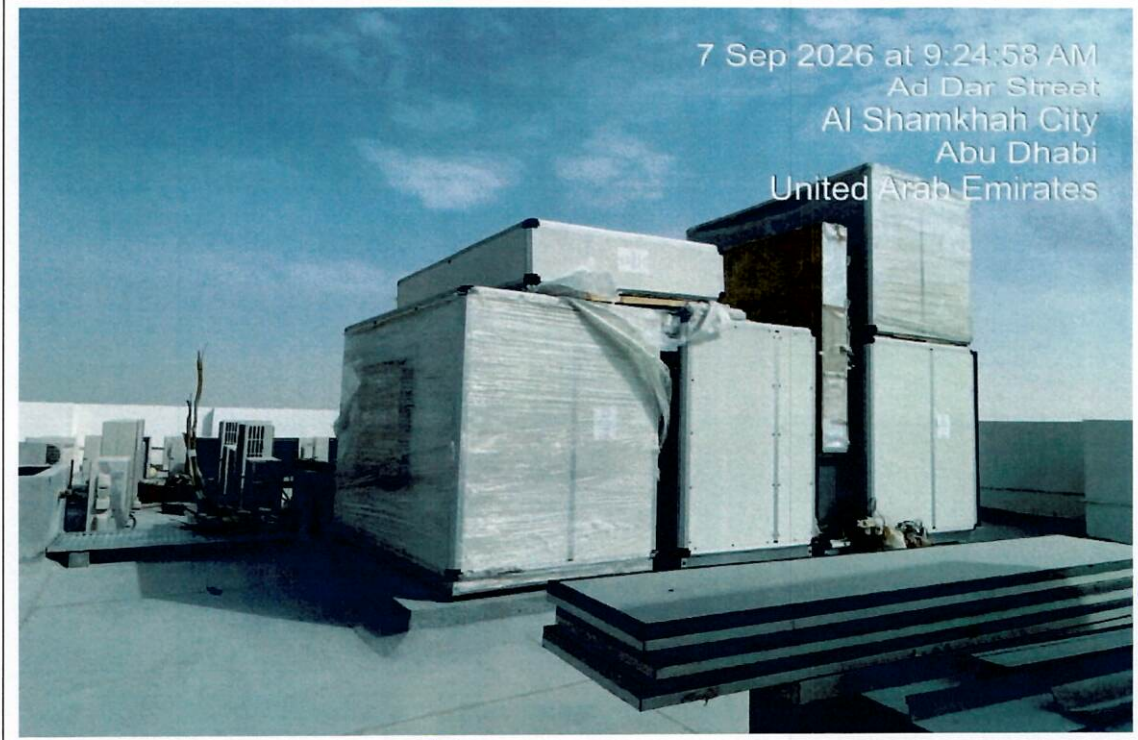

7 Sep 2026 at 9:24:58 AM
Ad Dar Street
Al Shamkhah City
Abu Dhabi
United Arab Emirates

Handwritten signature in blue ink.
