



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project

Report Date	24/09/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Al Reeman Gate	اسم المشروع
Project Number	20260000815344	رقم المشروع
Developer	THIRD QUARTER PROPERTY DEVELOPMENTS - L.L.C - S.P.C	المطور
Plot Number / Details	Plot: C108	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al-Shamkha City	المنطقة
Sector - Municipality	SH36	الحوض - البلدية
Consultant	MANISA STUDIO ENGINEERING CONSULTANCY - L.L.C	الاستشاري
Project Manager	-	مدير المشروع
Main Contractor	CIVEX GENERAL CONSTRUCTION	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties LLC		24/08/2026

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	6.72 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	-

Notes	ملاحظات
The project is delayed -7.79%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية	
Company representative: Arram Zuhud	ممثل الشركة: عرام زهد	
Head of Projects Management Consultancy	رئيس قسم إدارة المشاريع	





صور الموقع والمشروع Site and project Images



24 Aug 2026 at 8:54:20 AM
Wadi Al Mdheem Street
Al Shamkhah City
Abu Dhabi
United Arab Emirates



24 Aug 2026 at 8:54:23 AM
Wadi Al Mdheem Street
Al Shamkhah City
Abu Dhabi
United Arab Emirates

نيس






صور الموقع والمشروع Site and project Images



24 Aug 2026 at 8:55:32 AM
Jabal Ar Riq Street
Al Shamkhah City
Abu Dhabi
United Arab Emirates

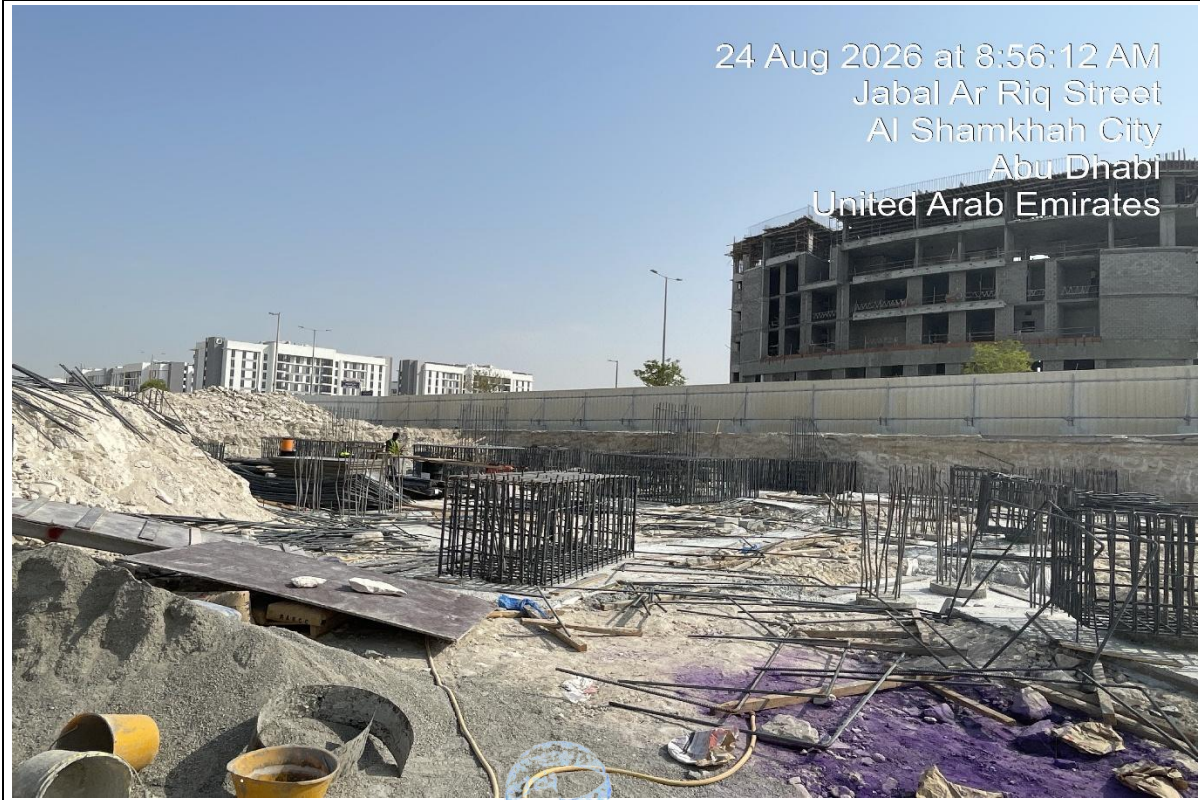

24 Aug 2026 at 8:56:12 AM
Jabal Ar Riq Street
Al Shamkhah City
Abu Dhabi
United Arab Emirates



صور الموقع والمشروع Site and project Images



نفس

