



تقرير نسب الانجاز في مشروع تطوير عقاري
Construction Progress Report for Real Estate Project


Report Date	13/08/2026	تاريخ التقرير
Project Name	Reeman Residence 01	اسم المشروع
Project Number	20250000721091	رقم المشروع
Developer	TOWAIJI Real Estate Development – L.L.C – S.P.C	المطور
Plot Number / Details	Plot C60	رقم الأرض / معرف العقار
Zone	Al Shamkhah	المنطقة
Sector - Municipality	SH36	الحوض - البلدية
Consultant	Makan Consulting Engineers LLC	الاستشاري
Project Manager		مدير المشروع
Main Contractor	Five Moons General Contracting	المقاول الرئيسي

Engineering Company	الشركة الهندسية	Site visit Date	تاريخ زيارة الموقع
MPM Properties		11/08/2026	

Actual Progress Percentage	نسبة الإنجاز الفعلي	42.12 %
Progress Percentage from the Last Progress Report	نسبة التقدم في الإنجاز منذ آخر تقرير هندسي	14.15 %


Notes	ملاحظات
The project is delayed by -10.79%	

Engineering Company Signature	توقيع الشركة الهندسية
Company representative: Mohammed Al Araj	ممثل الشركة: محمد الأعرج
Projects Manager - Projects Management Consultancy	مدير مشاريع - قسم إدارة المشاريع





Site and project Images صور الموقع والمشروع

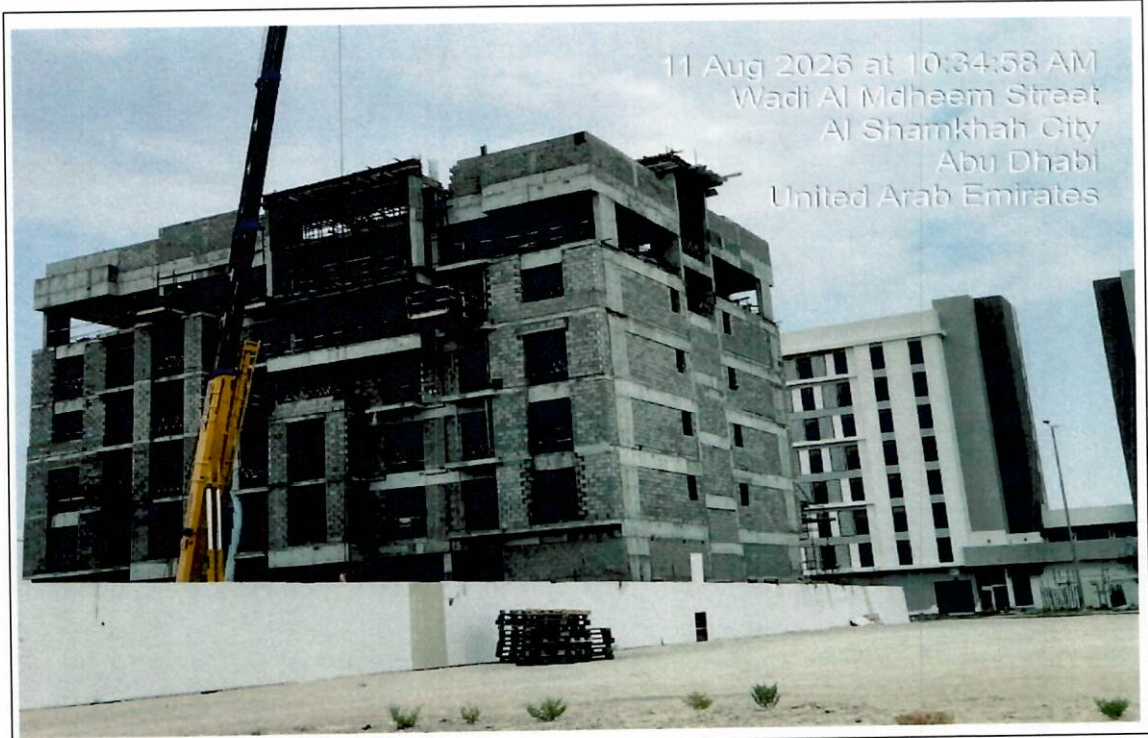

11 Aug 2026 at 10:34:58 AM
Wadi Al Mdheem Street
Al Shamkhah City
Abu Dhabi
United Arab Emirates



11 August 2026
Liwa Street

Site and project Images صور الموقع والمشروع




support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential

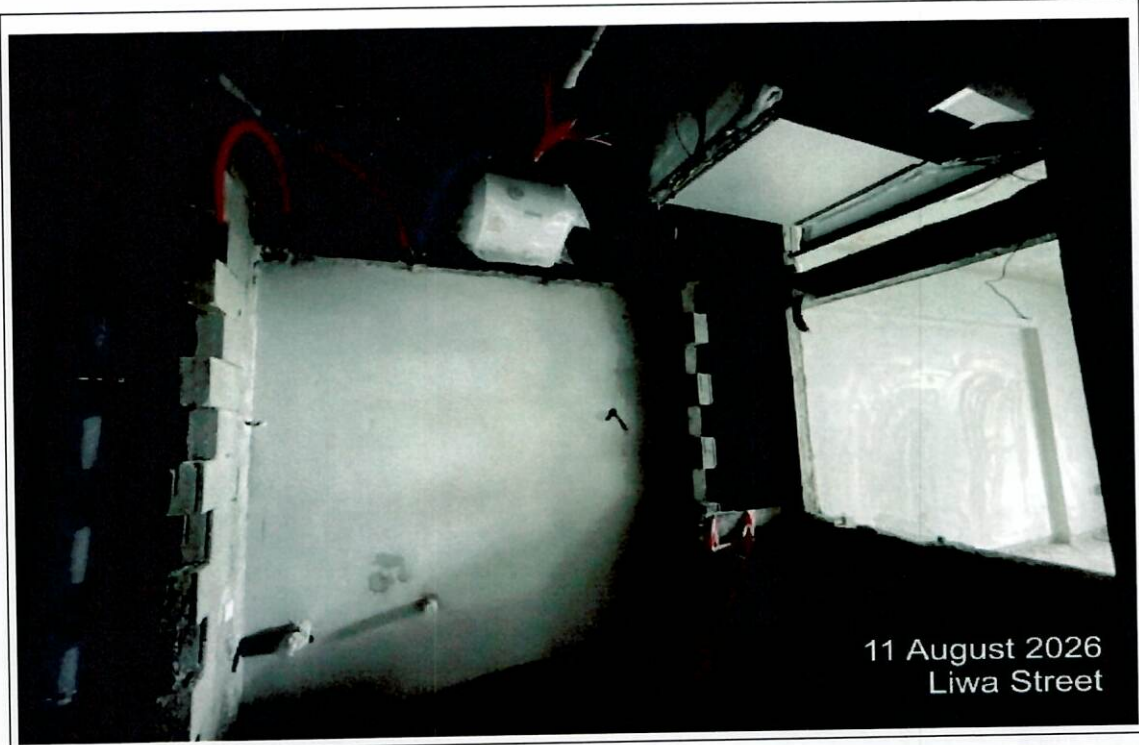

11 August 2026
Liwa Street



11 August 2026
Liwa Street

Site and project Images صور الموقع والمشروع



support@dari.ae

الإمارات العربية المتحدة

P.O.Box 1234, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.dari.ae

Confidential
